

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych

Realizacja Projektu Informatycznego
Projekt Grupowy

Kanban: Tablica Kanban

Temat projektu: Wykrywanie jaskry z użyciem inteligentnej analizy
obrazów dna oka

Członkowie zespołu (388):

Martyna Borkowska (kierownik), Karolina Glaza, Mateusz Dobry, Agnieszka Pawłowska,
Amila Amarasekara, Antoni Naczke

Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Data: 26 kwietnia 2026

Sprint: nr 6 (06.05.2026 - 15.05.2026)

Gdańsk, 2026

1 O projekcie i produkcji

Projekt skupia się na stworzeniu zintegrowanego systemu do wczesnego wykrywania jaskry. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji (YOLO + UNet++) do analizy zdjęć dna oka pod kątem współczynnika Cup-to-Disc Ratio (CDR). System składa się z aplikacji mobilnej iOS, backendu w chmurze Azure oraz specjalistycznej nakładki na aparat smartfona.


2 Stany zgłoszeń/zadań

Poniżej zdefiniowano cykl życia zadania w projekcie. Każdy stan odpowiada kolumnie na tablicy.

Nazwa stanu	Opis i znaczenie	Kryterium wyjścia (DoD)
Todo	Zadania wybrane do realizacji w bieżącym sprincie.	Stworzenie gałęzi z przypisanego zadania i rozpoczęcie pracy.
In progress	Aktywne prace programistyczne lub projektowe.	Zakończenie tworzenia kodu/dokumentacji i otwarcie pull requesta.
In review	Sprawdzanie kodu przez innych członków zespołu.	Zatwierdzenie zmian przez ≥ 2 osoby oraz bota walidującego.
Done	Ukończone zadania zmergowane do gałęzi <code>main</code> .	Zadanie wdrożone/zamknięte.

Tabela 1: Opis stanów zadań na tablicy Kanban

Zależności przejść pomiędzy możliwymi stanami zostały przedstawione na diagramie poniżej.

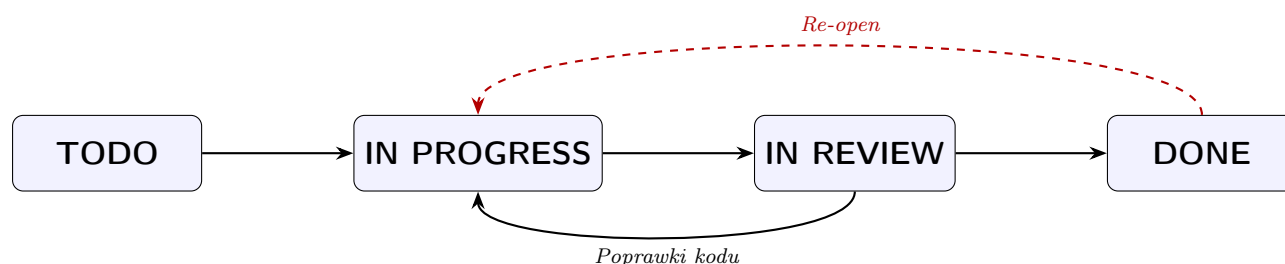

Rysunek 1: Diagram przejść z uwzględnieniem ścieżek błędów.


3 Limity WIP (Work In Progress)

Aby zapewnić płynność przepływu ustalono następujące limity dla kolumn:

- **Todo: Bez limitu** - Zakres sprintu ustalany jest w sposób elastyczny, w zależności od potrzeb zespołu.
- **In progress: 6** - Umożliwienie każdemu członkowi pracy nad własnym zadaniem, z wymaganiem ukończenia bieżącego zadania przed otwarciem nowego.
- **In review: 4** - Limit ma na celu zapobieganie gromadzeniu się zadań czekających na sprawdzenie. Priorytetem zespołu jest domykanie zadań będących blisko końca, a nie rozpoczęcie nowych.
- **Done: Bez limitu** - Maksymalna ilość zadań jest adekwatna do ograniczenia kolumny Todo.

4 Tablica Kanban

Tablica Kanban została wykonana za pomocą narzędzia wspomagającego Github Projects.

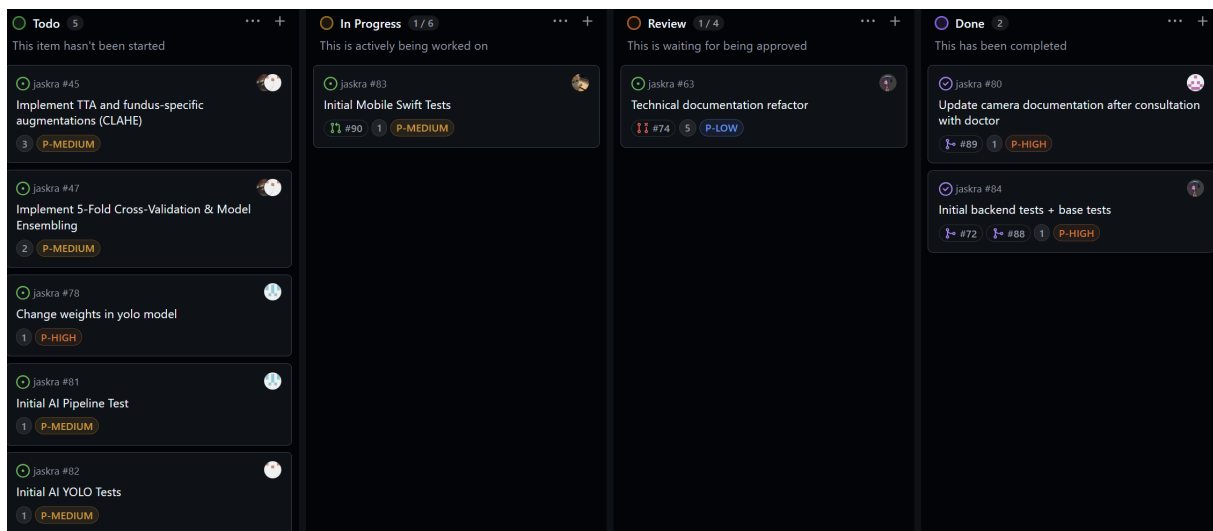

Rysunek 2: Zrzut ekranu tablicy.

5 Metryki produktywności

W celu monitorowania efektywności zespołu przyjęto następujące wskaźniki:

- **Throughput (Przepustowość)**: Liczba zadań ukończonych w jednostce czasu (np. na tydzień). (*Board->insights*)
- **Lead Time (Czas realizacji)**: Całkowity czas od momentu dodania zadania do tablicy do jego finalizacji. (*Issue->timeline*)

- **WIP (Work-in-progress - praca w toku):** Liczba zadań o statusie in progress. (*Board->insights*)
- **Cycle Time (Długość cyklu):** Czas od rozpoczęcia pracy nad zadaniem do jego zakończenia. Pozwala ocenić realne tempo pracy. (*Issue->timeline*)
- **Individual Work-In-Progress (Indywidualny wskaźnik WIP):** Kontrola liczby zadań przypisanych do jednej osoby w danym momencie. (*Board->insights*)
